



Geo Kennis-Op-Maat



Kwartaal event 2019 workshop

Geo Kennis op Maat Procesinnovatieprijs Infratech 2019

Door; Uzelf
mmv; Tjaart Vos, Ruud Mutsaers, Lisette
Kramer, en de andere aanwezigen




Basisregistratie
Ondergrond



Geo Risico Management

betere
optimale
minder
minder
minder
minder

Ruimteplannen
Contractvorming
Faalkosten
Juridische nasleep
Persoonlijk letsel
Imagoschade

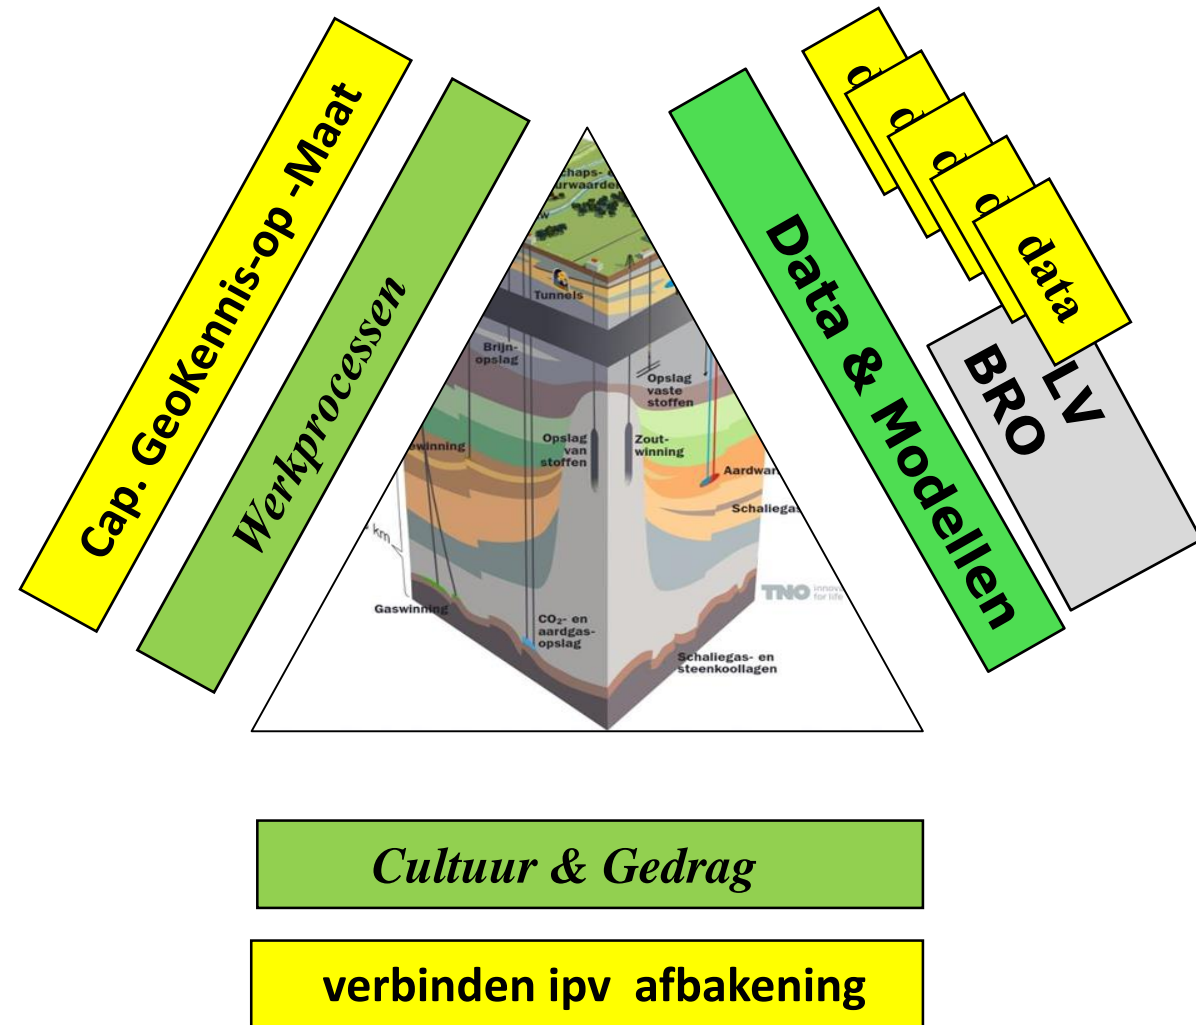



Project faseringen

Fase 1 Bestuurlijke Agenda

Fase 2 (MIRT) Verkenning

Fase 3 (MIRT) Planonderzoek

Mer Commissie

Tracebesluit/projectbesluit


Fase 5 Realisatie

& BRO rollen

bestuurders, beleidsmakers, begroters

beleidsmakers, begroters en technici

beleidsmakers, technici en begroters

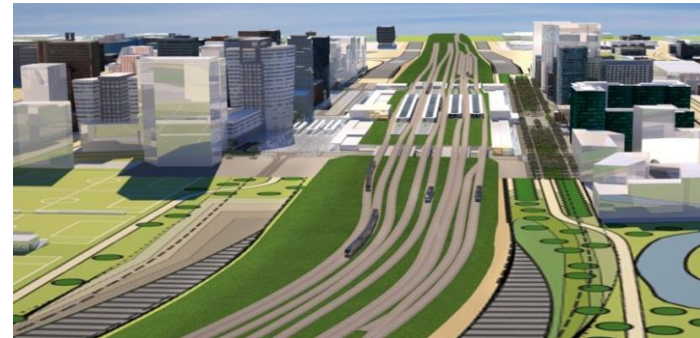

contract, technici, planners, calculatie

"Technische afnemers/ functionele afnemers, en de Gelukkigen"



Van BRO data.....-> via informatieproduct, naar wijs besluit

Gereedschap;

- GeoKM zeef
- Kanskaarten Geotechnische risico's
- Dino Loket/BRO
- Archieven en mensenkennis
- Risicodossier



Van BRO data.....-> via informatieproduct, naar wijs besluit

Gereedschap;

1. Handreiking

Geo RisicoManagement;


Welke rol in welke fase voor;

Technisch manager

Contractmanager

Omgevingsmanager

Ondersteund door **de Geo driehoek !**

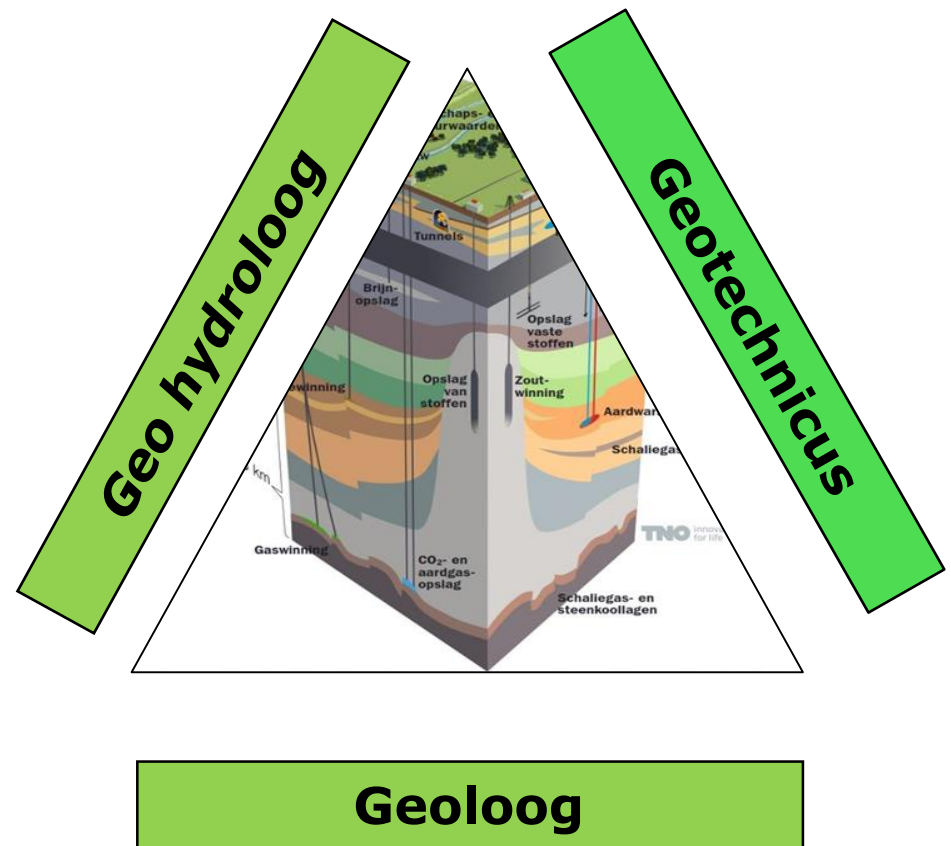




Van BRO data.....-> via informatieproduct, naar wijs besluit

Gereedschap;

2 Geo Projecten Zeef

Criteria;

- Project in/met/op ondergrond**
- Locatie project**
- Aanwezige belendingen**
- Tijdsdruk**

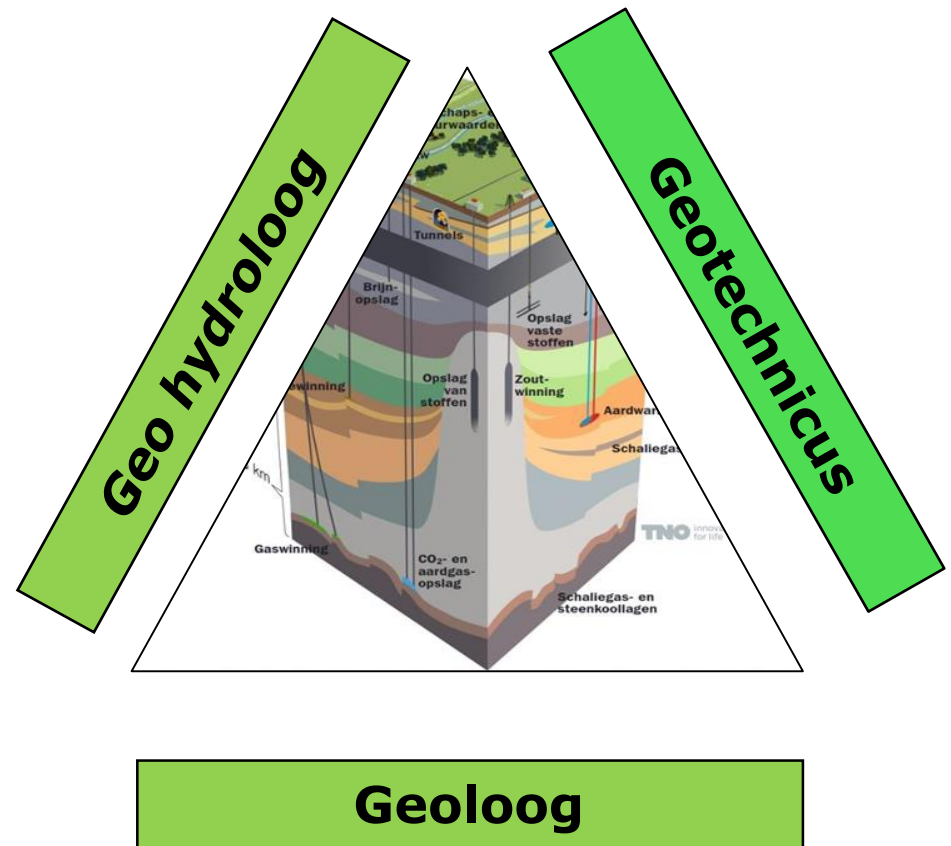




Van BRO data.....-> via informatieproduct, naar wijs besluit

Gereedschap;

**2 Geoweb Kanskaarten
risico's wegenbouw**

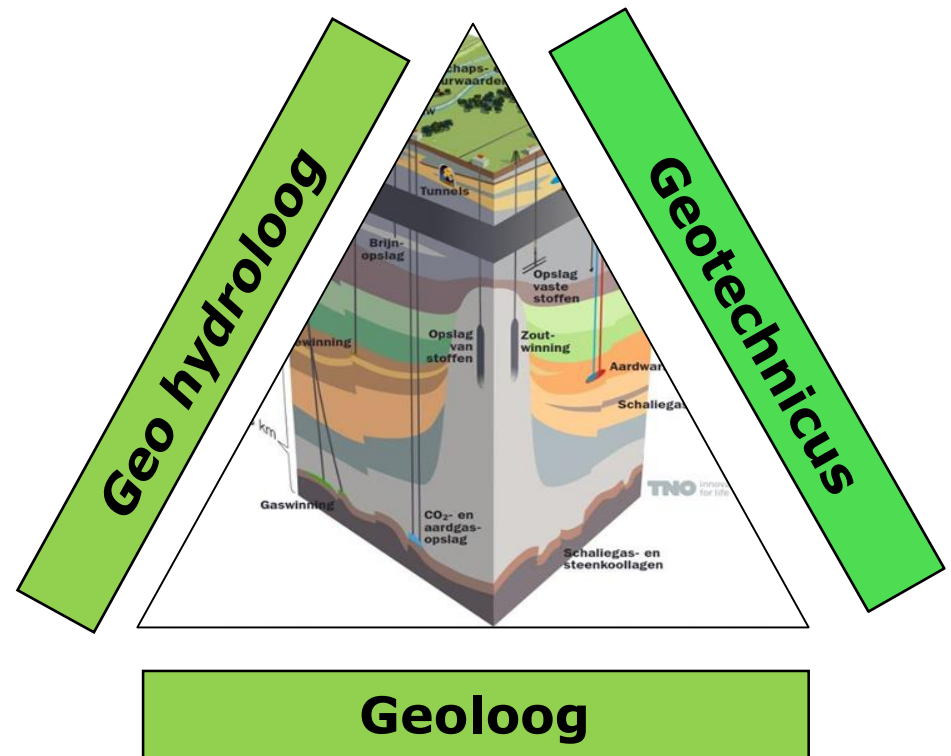

https://geoservices.intranet.rijkswaterstaat.nl/ao/geoweb51/index.html?viewer=KPP_Kanskaarten.Webviewer



Van BRO data.....-> via informatieproduct, naar wijs besluit

Gereedschap;

- GeoKM zeef
- Kanskaarten Geotechnische risico's
- **Dino Loket/BRO**
- **Archieven en mensenkennis**
- **Risicodossier**



Project faseringen

Fase 1 Bestuurlijke Agenda

Fase 2 (MIRT) Verkenning

Fase 3 (MIRT) Planonderzoek

Mer Commissie

Tracebesluit/projectbesluit

Fase 5 Realisatie

"Technische afnemers/ functionele afnemers, en de Gelukkigen"


Van BRO data.....-> via informatieproduct, naar wijs besluit

& BRO rollen

bestuurders, beleidsmakers, begroters

beleidsmakers, begroters en technici

beleidsmakers, technici en begroters

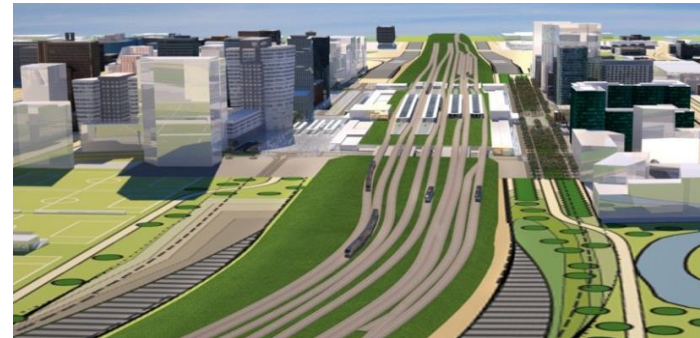

contract, technici, planners, calculatie
